

## Informe evaluación de la Memoria y Cuenta de Energía Eléctrica 2015

### **1. Introducción**

El presente informe recopila la evaluación realizada al informe de Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), basados en el instructivo mediante el cual se regula la formación de la memoria y la cuenta anual de los órganos de la administración pública, y la revisión de las fichas técnicas de los proyectos llevados a cabo por el Ministerio y sus entes adscritos publicados en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164.

### **2. Metodología**

La presente evaluación practicada sobre la Memoria y Cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica, presentada por el Ministro Luis Motta Domínguez, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. Se practicó a los efectos de determinar el porcentaje de cumplimiento de lo establecido en la normativa legal, realizando observaciones de forma a la información presentada. Además se revisó los proyectos ejecutados por el ministerio y sus entes adscritos, haciendo énfasis en los proyectos de la Corporación Nacional de Electricidad (CORPOELEC) verificando el cumplimiento de la información presentada en comparación a los objetivos establecidos en la providencia en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.164, que aprueba su presupuesto de gastos para 2015.

#### **a. Marco Jurídico**

##### Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.”

Para la evaluación de forma de las Memoria y Cuenta, se verificó la observancia de la normativa legal siguiente:

##### Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional

###### *De las Comisiones:*

###### *Comisiones Permanentes*

“Artículo 38. La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los sectores de la actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y promover la participación ciudadana, estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones, realizar investigaciones, ejercer controles; ... y demás materias en el ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes, ... en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y este Reglamento.”

###### *Competencia de las comisiones permanentes*

“Artículo 39. Las comisiones permanentes son:  
Comisión Permanente de Contraloría: tendrá a su cargo la vigilancia sobre la inversión y utilización de los fondos públicos en todos los sectores y niveles de la Administración Pública, así como sobre la transparencia a que están obligados los entes financieros y públicos con las solas limitaciones que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.

##### Ley Orgánica de la Administración Pública

*Contenido de las memorias de las ministras o ministros*

“Artículo 78 Las memorias que las ministras o ministros deban presentar a la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contendrán la *exposición razonada y suficiente de las políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados, impactos y obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año inmediatamente anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año siguiente*. Si posteriormente se evidenciaren actos o hechos desconocidos por el ministro o ministra, que por su importancia merecieren ser del conocimiento de la Asamblea Nacional, estos serán dados a conocer.

Las ministras o ministros en la memoria y cuenta de su gestión informarán anualmente a la Asamblea Nacional acerca de las *actividades de control que ejerzan, en los términos previstos en el presente Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica sobre los entes que le estén adscritos o se encuentren bajo su tutela*”. En las memorias se insertarán aquellos *documentos que la ministra o ministro considere indispensables, teniendo en cuenta su naturaleza y trascendencia*.

*Presentación de la cuenta*

“Artículo 80. Acompañada de la memoria, cada ministerio presentará una cuenta que contendrá una *exposición de motivos y los estados financieros conforme a la Ley*.”

*Vinculación de la cuenta a la memoria*

“Artículo 81. La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan estratégico y operativo respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposición integrada de la gestión de la ministra o ministro y permita su evaluación conjunta.”

Adicionalmente se utilizó para el análisis la Providencia mediante la cual se Regula la Formación de la Cuenta que Acompañará a la Memoria Anual de los Órganos de la Administración Pública Central MINISTERIO DE FINANZAS OFICINA NACIONAL DE CONTABILIDAD. Número 06-004 del 20 de diciembre de 2006 Publicada en Gaceta Oficial N° 38.600 del 09 de enero de 2007.

## **b. Metodología de Validación de forma de la Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE**

La metodología utilizada para la evaluación consiste en el análisis de los elementos que deben conformar y estar presente en la Memoria y la Cuenta presentada por cualquier ministerio de Administración Pública, así como el establecimiento de una ponderación con el fin de cuantificar el grado de cumplimiento de las premisas legales de la Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE, la cual se encuentra conformado por las siguientes categorías:

### Presentación de Memoria

- Denominación y competencia del Órgano y Marco Normativo Aplicable
- Logros Alcanzados
- Líneas de Acción
- Proyectos Ejecutados
- Obstáculos de la gestión
- Descripción de Órganos Desconcentrados
- Descripción de Entes Descentralizados
- Líneas y Planes de Acción para el año siguiente

### Presentación de la Cuenta

- Exposición de motivos
- Cuenta de Gasto: Estados Contables, Resultados
- Proyectos
- Acción Centralizada
- Órganos desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente

## 2. Análisis de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015


El Ministerio tuvo asignados 17 proyectos para el año 2015, del análisis de la Memoria y Cuenta resalta la carencia de información explicativa del uso dado a los recursos financieros que no fueron ejecutados en su totalidad, hecho ocurrido en el 100% de los proyectos.

Entre los vacíos de información exigidos por el instructivo de evaluación destacan:

1. En la Memoria las actividades de control sobre los entes adscritos es incompleta, y en particular en cuanto a los entes adscritos bajo la figura de órganos desconcentrados (Centro Nacional de Despacho (CND) y Fondo para la Energía Eléctrica) de los que no hay ninguna información de actividades de control ejercidas por el Ministerio.
2. Dentro de las líneas de acción del Ministerio la Memoria no indica concretamente las metas planteadas para el año 2015, solo incluye los objetivos y competencias del Ministerio.
3. En la Cuenta no hay información de las políticas sectoriales, ni del Plan Operativo Anual.
4. En la Cuenta no aparece el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados.
5. En la Cuenta tampoco hay notas explicativas de cada estado financiero, información que es necesaria para detallar, ampliar o definir claramente el contenido de las cuentas.
6. No hay una explicación de los posibles incumplimientos en todos los proyectos del Ministerio y sus entes adscritos.

La revisión en cuanto a la forma de presentación de la Memoria y Cuenta del Ministerio dio como resultado una ponderación de 62% de incumplimiento con la norma de presentación.

**MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA**  
**% DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MEMORIA Y CUENTA**  
**EN RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL**

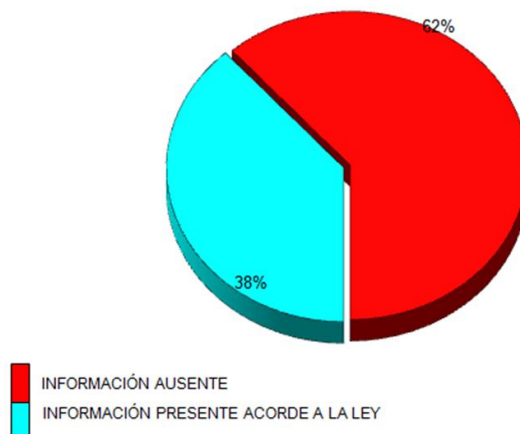

### 3. Evaluación de los Proyectos del Ministerio

#### 3.1 Evaluación proyectos del Ministerio

El MPPEE contó con un presupuesto de gastos al mes de diciembre de 2015 de Bs. 41.386.055, de los cuales solo Bs. 11.511.374.953 correspondieron a la asignación por vía Ley de Presupuesto, recibiendo en total 8 autorizaciones de créditos adicionales. El presupuesto aprobado para 2015 asignó 17 proyectos al Ministerio, de los cuales 2, tuvieron un avance físico de 0,00% tratándose de los proyectos; Implementación de Sistemas y Optimización de los activos de información del MPPEE, y el proyecto de Modernización de Los Despachos de Carga a Nivel Nacional.

Con la intención de determinar cuál fue el uso de los recursos con los que contó el Ministerio por presupuesto y sus respectivas modificaciones durante el año para el cumplimiento de sus metas se elaboró la siguiente tabla que se presenta a continuación:

**Tabla 1 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas en los proyectos del MPPEE**

Ente	Proyecto	PRESUPUESTO			METAS FISICAS		
		Ley	Modificaciones	% de Ejecución	Unidades	Meta	%
MPPEE	Fortalecimiento de la Atención Ciudadana en el Sector Eléctrico.	25.792.316	24.700.760	91,72%	Proceso	8	96,25%
	Apoyo a las diferentes unidades del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en materia de soporte comunicacional y de relacionamiento	270.073.528	105.349.736	67,02%	Programa	1	67,47%
	Plan Comunicacional Masivo para la Población Venezolana	448.334.400	265.361.896	80,10%	Campaña	1	93,00%
	Fortalecimiento de las Habilidades y Capacidades Técnicas del Personal del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	22.793.325	21.501.201	85,94%	Plan	1	54,73%
	Adecuación y mantenimiento de las instalaciones y bienes públicos del Ministerio del Poder Popular para	516.499.200	273.230.362	41,95%	Servicio	446	100,00%

la Energía Eléctrica							
Implementación de Sistemas y Optimización de los activos de información del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica	143.397.391	34.640.207	91,56%	Sistemas	3	0,00%	
Modernización de Los Despachos de Carga a Nivel Nacional	172.040.577	81.500.010	6,71%	Plan	1	0,00%	
Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica del MPPEE	254.879.703	131.759.801	42,25%	Servicio	5	60,00%	
Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PDSN) a Largo Plazo, Fase I/III.	33.941.582	14.796.725	47,59%	Documento	1	100,00%	
Estudios técnicos, regulatorios y tarifarios para la transición hacia el nuevo modelo económico enmarcado en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE). Fase II	13.397.369	9.641.707	62,93%	Estudios	10	100,00%	
Fortalecimiento del Proceso General de Fiscalización Pública y Comunal del Sistema y Servicio Eléctrico	25.296.848	13.798.511	66,26%	Proceso	1	100,00%	
Conformación de las Redes Sociales de Articulación Territorial en las actividades del sistema y servicio eléctrico	16.744.266	16.643.454	53,62%	Red	4	64,50%	
Estudios del Potencial y Factibilidad para el Aprovechamiento de las Energías Alternativas en Venezuela	9.358.856	1.304.456	12,47%	Estudios	10	100,00%	

Seguimiento, Control y Evaluación de los Procesos de Regulación en el uso de las Fuentes Radioactivas y los Equipos Generadores de las Radiaciones Ionizantes y la Producción Radioisótopos	2.514.721	1.398.897	37,23%	Informe	12	39,67%
Formación y Capacitación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía	13.216.000	8.188.397	69,88%	Programa	1	94,54%
Diseño del Marco Regulatorio relativo al Uso Racional y Eficiente de la Energía.	5.434.800	2.993.200	78,77%	Normativa	4	97,50%
Investigación y Estudios Aplicados a los Usuarios Públicos y Privados en Materia de Uso Racional y Eficiente de la Energía	6.432.400	3.175.628	70,68%	Informe	116	100,00%

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015

1) La información sobre las metas cumplidas no detallan el lugar exacto del cumplimiento de la misma, como es el caso del proyecto *“Conformación de las Redes Sociales de Articulación Territorial en las actividades del sistema y servicio eléctrico”* que tenía como acción específica la de *Conformar Redes Sociales de Articulación Territorial entre el Servicio Eléctrico Nacional y el Poder Popular*, pero no explica en qué comunidades fueron conformadas las redes de articulación.

2) La Memoria y Cuenta no explica las razones del incumplimiento de las metas fijadas en los proyectos, como es el caso del proyecto de *“Modernización de Los Despachos de Carga a Nivel Nacional”*, que a pesar de haber ejecutado 6,71% de los recursos, tuvo un avance físico de 0,00%.

3) En la Memoria y Cuenta se reconoce tener registrados a 6.425.306 usuarios del servicio eléctrico al cierre de noviembre de 2015. Entendiendo que por cada vivienda del país hay un usuario del servicio eléctrico, estarían quedando por fuera 1.791.137 de las 8.216.443 viviendas existentes en el país según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas para 2011.

#### 4. Evaluación de proyectos de los entes adscritos al MPPEE

El MPPEE contó con 11 entes adscritos en 2015 de los cuales ninguno tiene la figura de órgano desconcentrado con personalidad jurídica. La clasificación de los entes es la siguiente:

**Tabla 2 - Entes adscritos al MPPEE**

<b>Entes descentralizados con fines empresariales</b>	1. Corporación Eléctrica Nacional, S. A. (Corpoelec)
	2. Comunicaciones Móviles EDC C.A. (Commóvil)
	3. EDC Network Comunicaciones S.C.S.
	4. Administradora Serdeco C.A.
	5. Arrendamiento de Locales Comerciales, S.A. (Aracoi)
	6. Corporación Industrial para la Energía Eléctrica, S.A. (Corpoelec Industrial)
	7. Conductores de Aluminio del Caroní, C.A. (CVG Cabelum)
<b>Entes descentralizados sin fines empresariales</b>	1. Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrica (Fundelec)
	2. Fundación Instituto de Desarrollo Energético Luis Zambrano (Fidelz)
<b>Órganos desconcentrados sin personalidad jurídica</b>	1. Centro Nacional de Despacho (CND)
	2. Fondo para la Energía Eléctrica <sup>1</sup>

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

El Ministerio realizó aportes y transferencias a sus entes adscritos que se ejecutaron la siguiente manera, siendo Corpoelec el ente que contó con más recursos.

**Tabla 3 - Aportes y Transferencias para los entes descentralizados del MPPEE**

Ente	Presupuesto Acordado	Gasto Causado
Fundación Instituto para el Desarrollo Energético Instituto Luis Zambrano	Bs. 29.554.854,00	Bs. 29.554.854,00
Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico	Bs. 1.090.193.332,00	Bs. 1.090.193.332,00
Corporación Industrial para la Energía Eléctrica (CIEE)	Bs. 100.000.000,00	Bs. 99.999.999,00
CORPOELEC	Bs. 37.773.594.591,00	Bs. 34.468.789.157,56
<b>Total</b>	<b>Bs. 38.993.342.777,00</b>	<b>Bs. 35.668.537.342,56</b>

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

#### 4.1 Corpoelec

##### a. Competencias sin información

La Memoria y Cuenta enumera las 13 competencias que recaen directamente en Corpoelec, pero no hay ninguna información que explique el cumplimiento de 2 de sus responsabilidades como lo son:

<sup>1</sup> No rindió cuentas en el informe de gestión.

- Compensar a los usuarios los daños causados como consecuencia de fallas en la prestación del servicio eléctrico, tal y como lo establece la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico<sup>2</sup>.
- Suspender el servicio eléctrico, previo aviso, en caso de interrupciones programadas y en caso de peligro o riesgo inminente.

---

<sup>2</sup> Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, artículo 36 numeral 8: “Las empresas de distribución de energía eléctrica tienen, entre otras, las obligaciones siguientes: **8.** Compensar los daños causados a sus usuarios como consecuencia de fallas en el suministro de energía eléctrica o mala calidad del mismo, de conformidad con esta Ley y su Reglamento.”



Siendo el ente adscrito al MPPEE que contó con más recursos en 2015, con un presupuesto de gastos aprobado de Bs. 122.744.116.034, Corpoelec contó con 32 proyectos para 2015 según el presupuesto publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164. Sin embargo en la Memoria y Cuenta hay información de 34 proyectos, apareciendo los proyectos; *Construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vultosa)* y la *Expansión y Adecuación de la Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Sur Occidente*, que no estaban contemplados en el presupuesto de gastos aprobado.

Para entender la ejecución de los recursos con los que contó Corpoelec en el cumplimiento de sus proyectos elaboramos la siguiente tabla:

**Tabla 4 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas en los proyectos de Corpoelec**

Proyecto	PRESUPUESTO			METAS FISICAS		
	Ley	Modificaciones	% de Ejecución	Unidades	Meta	%
Generar la Energía Eléctrica	9.826.053.588	10.310.941.656	80,74%	Gwh	136.042	95,50%
Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Oriente	918.228.151	391.730.255	47,26%	MW	1720	0,00%
Expandir infraestructura de generación termoeléctrica región occidente	385.580.935	281.453.399	51,79%	MW	2580	0,00%
Expandir Infraestructura de Generación Alternativa	267.580.935	527.078.397	0,08%	MW	3010	0,00%
Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación Hidroeléctrica	1.391.002.789	1.147.561.005	22,00%	MW	1.290	86,00%
Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación Termoeléctrica	4.331.783.696	2.848.969.459	57,33%	MW	2.580	29,64%
Proyecto de Rehabilitación y Mejoras de Infraestructura de Generación Distribuida	988.295	988.296	0,00%	Obras	3.870	0,00%
Transmitir Energía Eléctrica	6.368.427.478	8.951.709.144	82,59%	%	100	60,39%
Desarrollo de Ingeniería y Gestión de Construcción de Infraestructura de Generación y Transmisión	1.779.045.869	1.551.257.623	53,30%	HH	1.720	55,00%
Distribuir Energía Eléctrica	18.083.188.358	13.503.292.142	89,52%	TTI	1.720	98,43%

Ampliaciones y mejoras de las redes de distribución eléctrica	4.882.078.222	2.252.143.300	24,36%	TTI	1.290	43,66%
Comercializar energía eléctrica	3.118.657.529	9.915.034.808	79,13%	Gwh	860	91,74%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Corporación Eléctrica Nacional*	1.172.624.030	839.578.026	19,27%	Modelo	430	0,00%
Red de Transporte de Banda Ancha Basado en Fibra Óptica para Corpoelec	270.400.780	355.018.265	1,14%	Kilometro	2.580	81,23%
Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma*	8.488.856.070	5.924.928.087	58,37%	Mw	3.010	39,29%
Planta Termozulia III*	1.329.251.228	1.913.705.568	6,37%	Mw	430	2,70%
Rehabilitación de las Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri)*	1.180.632.184	1.180.632.184	23,89%	Unidad	430	3,00%
Construcción de la Planta de Generación Termoeléctrica Antonio José de Sucre (Planta Cumaná)	1.412.103.040	644.504.330	92,69%	Mw	860	76,83%
Construcción de subestación encapsulada en Sf6 en la zona urbana de Maracaibo*	641.011.144	716.507.181	14,82%	Instalación	860	0,00%
Sistema de transmisión en 400 KV asociado a las subestaciones Buena Vista y El Venado	100.000.000	100.138.915	15,80%	Obra	430	4,00%
Construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltoza)		338.624.129	81,28%			56,00%
Planta Don Luis Zambrano (Vigía) con sus obras de transmisión asociadas	1.415.993.389	1.773.377.698	47,44%	Mw	430	12,00%
Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Central	3.750.806.941	3.182.510.594	66,15%	Mw	430	0,00%
Proyecto de Generación Termoeléctrica de Carácter Complementario	473.362.364	462.440.491	20,04%	Mw	430	0,00%
Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Central	2.268.661.647	1.344.261.951	12,78%	Obra	430	0,00%
Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Occidental	2.629.340.350	923.161.112	42,60%	Obra	430	20,19%

Proyecto Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Sur Occidente		124.465.996	0,00%			0,00%
Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Oriental	2.261.442.731	2.254.571.061	60,27%	Obra	430	0,05%
Ampliación y Adecuación de las Edificaciones Administrativas de Corpoelec 2014 - 2017	185.040.000	185.040.000	19,12%	Obra	430	0,00%
Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en las Redes de Distribución a Nivel Nacional*	1.260.819.041	2.288.091.880	41,86%	MVA	430	0,00%
Obras nuevas Termozulia II*	1.587.635.417	134.032.500	0,00%	MVA	430	0,00%
Expansión de los Valles de Tuy*	343.196.571	343.196.571	0,00%	Obra	1.290	0,00%
Suministro e Instalación de Cable Sublacustre a 400kV en El Lago de Maracaibo*	923.977.460	438.327.873	0,00%	Obra	860	0,00%
Sistema de Transmisión Angostura 400/115 kV	1.211.585.322	1.167.487.186	79,09%	Obra	860	0,00%
<b>Estudios de Preinversión para el Sector Eléctrico Nacional</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Sin información</b>	<b>Sin información</b>	<b>Estudio</b>	<b>860</b>	<b>Sin información</b>

Fuente: cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015

1. Los siguientes proyectos recibieron recursos de "Otras Fuentes" sin especificar el origen de los recursos; *Generar la Energía Eléctrica, Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Oriente, Expandir infraestructura de generación termoeléctrica región occidente, Expandir Infraestructura de Generación Alternativa, Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación Hidroeléctrica, Rehabilitación y mejoras de infraestructura de Generación Termoeléctrica, Transmitir Energía Eléctrica, Desarrollo de Ingeniería y Gestión de Construcción de Infraestructura de Generación y Transmisión, Distribuir Energía Eléctrica, Ampliaciones y mejoras de las redes de distribución eléctrica, Comercializar energía*

*eléctrica, Red de Transporte de Banda Ancha Basado en Fibra Óptica para Corpoelec, Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma, Planta Termozulia III, Construcción de la Planta de Generación Termoeléctrica Antonio José de Sucre (Planta Cumaná), Construcción de subestación encapsulada en Sf6 en la zona urbana de Maracaibo, Sistema de transmisión en 400 KV asociado a las subestaciones Buena Vista y El Venado, Construcción de la Central Hidroeléctrica Fabricio Ojeda (La Vueltona), Planta Don Luis Zambrano (Vigía) con sus obras de transmisión asociadas, Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Central, Proyecto de Generación Termoeléctrica de Carácter Complementario, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Central, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Occidental, Proyecto Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Sur Occidente, Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Oriental, Ampliación y Adecuación de las Edificaciones Administrativas de Corpoelec 2014 – 2017, Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en las Redes de Distribución a Nivel Nacional.*

2. El proyecto de nombre “Estudios de Preinversión para el Sector Eléctrico Nacional” que tenía aprobado Bs. 50.000.000 en el presupuesto de gastos aprobado para 2015, no aparece en la Memoria y Cuenta.
3. La Memoria y Cuenta señala que Corpoelec recibió transferencias de parte del FONDEN (Bs. 3.538.702.825), FONDO CHINO (Bs 454.801.336), FONDO INDEPENDENCIA (Bs. 136.906.804) y FONDO MIRANDA (Bs. 28.603.947.576), pero no especifica a qué proyectos o actividades fueron utilizados con estos recursos.
4. Dentro de las acciones específicas del único proyecto dirigido a la instalación del alumbrado público (Ampliaciones y mejoras de las redes de distribución eléctrica/Corpoelec) se reconoce que de 141.400 instalaciones previstas solo se logró efectuar 39.711.
5. En la Memoria de Corpoelec coloca como logro la facturación por concepto de venta de energía eléctrica de 19.447,2 millones de bolívares, pero en la Cuenta se detalla que la empresa registró pérdidas por Bs. -44.570.783

**b. Proyectos de Corpoelec con recursos vía Ley Especial de Endeudamiento**

Nueve proyectos contaron con recursos aprobados por vía de Ley Especial de Endeudamiento para el año 2015.

**Tabla 5: Proyectos de Corpoelec con recursos aprobados vía Ley Especial de Endeudamiento**

Proyecto	Tipo de moneda	Presupuesto Acordado (Bs.)	Gasto Causado (Bs.)	Nivel de Causación (%)
Central Hidroeléctrica Tocoma	Bs.	1.487.540.308,00	1.171.415.352,56	78,75
	US\$	236.117.509,21	185.938.944,85	78,75
Planta Termozulia III	Bs.	288.585.296,00		0,00
	US\$	45.807.189,84	0,00	0,00
Construcción de subestaciones encapsuladas en SF6 en la zona urbana de Maracaibo	Bs.	403.909.834,00	4.009.834,00	0,99
	US\$	64.112.672,06	636.481,59	0,99
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de CORPOELEC	Bs.	794.771.659,00	246.401.793,00	31,00
	US\$	126.154.231,59	39.111.395,71	31,00
Rehabilitación de las Unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Gun)	Bs.	990.947.697,00	154.679.325,00	15,61
	US\$	157.293.285,24	24.552.273,81	15,61
Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en las Redes de Distribución a Nivel Nacional	Bs.	815.687.680,00	815.687.680,00	100,00
	US\$	129.474.234,92	129.474.234,92	100,00
Suministro e instalación de cable sublacustre a 400 kV en el Lago de Maracaibo	Bs.	438.327.873,00		0,00
	US\$	69.575.852,86	0,00	0,00
Obras nuevas Termozulia II	Bs.	134.032.500,00		0,00
	US\$	21.275.000,00	0,00	0,00
Expansión de los Valles de Tuy	Bs.	343.196.571,00		0,00
	US\$	54.475.646,19	0,00	0,00
TOTAL	Bs.	5.696.999.418,00	2.392.193.984,56	41,99
	US\$	904.285.621,90	379.713.330,88	41,99

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE.

Como indica la tabla número 5, extraída de la Memoria y Cuenta del MPPEE, el Estado se endeudó por un monto de US \$ 191.133.687 teniendo como resultado una causación de 0,00% de los recursos. Los proyectos afectados fueron, Expansión de los Valles del Tuy, Termozulia II, Termozulia III y Cable Submarino del Lago de Maracaibo.

**c. Proyectos de Corpoelec con inconsistencias similares**

**c.1 Grandes obras inconclusas**

Son proyectos que beneficiarían a un número importante de personas, donde a pesar de contar con los recursos aprobados, la Memoria y Cuenta asegura que el incumplimiento de las metas es notable:

**Tabla 6 - Proyectos con mayor número de beneficiarios afectados por incumplimiento de metas**

Proyecto	Beneficiarios	Avance Físico
Expandir la infraestructura de generación termoeléctrica de la región central	30.587.736	0,00%
Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma	30.017.064	39,29%,
Transmitir Energía Eléctrica	30.155.352	60,39%
Planta Termozulia III	3.704.405	2,70%
Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica en el Oriente del país	6.750.000	0,05%

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

Detalles de los proyectos:

<b>Proyecto Expandir la infraestructura de generación termoeléctrica de la región central</b>
<b>Objetivo:</b> Instalación de nuevas unidades generadoras de energía termoeléctrica en la región central.
<b>Inconsistencia:</b> La Memoria y Cuenta no explica porque si hubo una ejecución financiera de Bs. 2.105.079.248 (63,22%), la obra tuvo un avance físico de 0,00% en 2015.

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

<b>Construcción de la Central Hidroeléctrica Tocoma (2013-2018)</b>
<b>Objetivo:</b> Cubrir el déficit en la demanda de energía eléctrica en el país.
<b>Inconsistencia:</b> La Memoria y Cuenta no explica cómo es que luego de haberse gastado Bs. 9.371.574.348, es decir 58,99% el avance físico de la obra fue de 39,29%.

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

<b>Planta Termozulia III (2014-2017)</b>
<b>Objetivo:</b> Energía Termoeléctrica para el Occidente del país.
<b>Inconsistencia:</b> Se reconocen el incumplimiento de la acción específica de inspeccionar las obras civiles electromecánicas, teniendo como meta 200 horas de inspección, efectuando ninguna.

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

<b>Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica en el Oriente del país (2014-2019)</b>
<b>Objetivo:</b> Expandir el sistema de transmisión a 765 kV, 400 kV, 230 kV y 115 kV en la región oriental.
<b>Inconsistencia:</b> La Memoria y Cuenta no explica porque si el proyecto tuvo una ejecución financiera de Bs. 185.135.098 (47,26%) tuvo un avance físico de 0,05%.

Fuente: Memoria y Cuenta 2015 del MPPEE

### c.2 Proyectos de Corpoelec con adelantos financieros pero con 0,00% de avance físico.

Se trata de los proyectos que a pesar de haber gastado parte de los recursos asignados para la obra dieron cuenta de un avance físico de 0,00%

**Tabla 7 - Proyectos de Corpoelec con adelanto financiero pero cero avance físico**

Proyecto	Avance financiero	Avance Físico	Meta de beneficiarios
Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica en el Oriente del país (Pág. 345)	Bs. 185.135.098 (47,26%)	0,00%.	491.610
Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Occidente (Pág. 346)	Bs.145.754.960 (22,24%)	0,00%.	5.614.251
Proyecto: Expandir Infraestructura de Generación Alternativa (Pág. 347)	Bs. 442.148,00 (0,08%)	0,00%.	3.703.640
Proyecto Expandir Infraestructura de Generación Termoeléctrica Región Central (Pág. 366)	Bs. 2.105.079.248 (66%)	0,00%.	30.587.736
Proyecto de Generación Termoeléctrica de Carácter Complementario (Pág. 367)	Bs. 296.628.317 (17,32%)	0,00%.	150.000
Sistema de Transmisión Angostura 400/115 Kv (Pág. 377)	Bs. 923.414.673 (79%)	0,00%.	450.000
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Corporación Eléctrica Nacional	Bs. 161.766.715 (19,27%)	0,00%	8.999.100
Construcción de subestación encapsulada en Sf6 en la zona urbana de Maracaibo	Bs. 106.152.792 (14,82%)	0,00%	4.017.916
Ampliación y Adecuación de las Edificaciones Administrativas de Corpoelec 2014 – 2017	Bs. 35.382.525 (19,12%)	0,00%	8.000
Consolidación de los Sistemas de Transmisión en las Regiones Occidental y Oriental y Mejoras en las Redes de Distribución a Nivel Nacional	Bs. 957.694.040 (41,86%)	0,00%	7.555.844
<b>Total</b>	<b>Bs. 4.917.450.516</b>	<b>0,00%</b>	<b>51.768.596</b>

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015

En total Corpoelec gastó **Bs. 4.917.450.516** en 10 proyectos que dieron como resultado al cierre del año 2015 un avance físico de 0,00%.

### c.3 Proyectos que no arrancan pero elevan su presupuesto

A pesar de contar con presupuestos aprobados se detectaron una serie de proyectos que no ejecutaron ni un solo bolívar en 2015. Al cotejar los proyectos con la memoria de 2014 se muestra que la fecha de culminación de la obra se ha venido alterando y en algunos casos los costos de la obra han venido creciendo.

**Tabla 8 - Proyectos de Corpoelec que no se ejecutan pero si elevan su presupuesto**

Proyecto	Objetivo	Avance financiero	Avance físico	Fecha final prevista 2014	Fecha final prevista 2015
				Monto total 2014	Monto total 2015
Expansión de los Valles de Tuy. Otro cambio significativo fue el monto total del proyecto.	Ampliar y mejorar el uso de la red de transmisión y distribución de electricidad , mediante la implementación de: Plan Robusto que permite ampliar la capacidad de transmisión en las siguientes subestaciones: Subestación San Carlos II 400/115 kV, Chivacoa	0,00%	0,00%	2014	2017
				<b>Bs. 992.799.001</b>	<b>Bs 2.664.207.000</b>
Proyecto de Rehabilitación y Mejoras de Infraestructura de Generación Distribuida.	Adecuar y mejorar infraestructura de emplazamientos de generación distribuida.	0,00%	0,00%	Sin información	2015
				Sin información	<b>Bs. 88.070.810</b>
Proyecto Expandir y Adecuar Infraestructura de Transmisión y Distribución Región Sur Occidente.	Expandir el sistema de transmisión región sur-occidente del país para asegurar la máxima evaluación de la energía generada hacia el sistema de distribución.	0,00%	0,00%	2017	2017
				<b>Bs.1.430.083.530</b>	<b>Bs.1.430.083.530</b>
Obras Nuevas Termozulia II.	Realizar obras asociadas al cierre del ciclo combinado de 470MW aproximadamente y el sistema de transmisión asociado a las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión para interconectar al SEN.	0,00%	0,00%	2016	2017
				<b>Bs.2.628.300.062.</b>	<b>Bs.2.628.300.062</b>
Suministro e instalación de cable sublacustre a 400 kV en el Lago de Maracaibo.	Sustituir líneas aéreas del cruce del Lago de Maracaibo por cables sublacustres. Esta obra tampoco termina de arrancar arranca.	0,00%	0,00%	2017	2019
				<b>Bs.1.762.633.460</b>	<b>Bs.2.520.000.000</b>

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015 y 2014



La Memoria y Cuenta no explica los cambios que indican el cuadro, ni las razones por la que los montos de algunos proyectos se han elevado o la fecha de culminación se ha modificado entre 2014 y 2015.

#### c.4 Proyectos con menos recursos pero iguales metas

**Tabla 9 - Proyectos de Corpolec con menos recursos**

Proyecto	Avance financiero 2014	Avance financiero 2015	Avance Físico 2014	Avance físico 2015	Monto total en 2014	Monto total en 2015
Desarrollo de Ingeniería y Gestión de Construcción de Infraestructura de Generación y Transmisión	85,30%	53,30%	100,00%	55,00%	Bs. 6.859.615.361	Bs. 1.551.257.623
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional de la Corporación Eléctrica Nacional	64,80%	56,27%	0,00%	0,00%	Bs. 1.584.150.668	Bs.1.133.585.590.
Rehabilitación de las unidades 1 a 6 de la Casa de Máquinas 1 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar	56,27%	23,89%	0,00%	3,00%	Bs. 10.308.194.463	Bs. 1.310.430.000

Fuente: Memoria y Cuenta de MPPEE 2015

Los tres proyectos presentados en la tabla 9 tenían las mismas metas fijadas que en 2014, esto a pesar de haber contado con menos recursos aprobados. La Memoria y Cuenta 2015 no explica cómo se pretendía cumplir con las mismas metas pero ahora con menos recursos.

#### d. Hallazgos Financieros de Corpolec

Tomando en cuenta que CORPOELEC contó el 91% de los recursos del MPPEE, los esfuerzos para la revisión de los estados financieros en la Cuenta 2015 estuvieron dirigidos a conocer la situación financiera de CORPOELEC. Esto permitió observar los indicadores financieros basados en los principios básicos económicos de una empresa como lo es su liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. Conoce los estados financieros de CORPOELEC a continuación:

**Tabla 10 - Situación financiera de Corpoelec**

<b>CORPOELEC</b>		
<b>LIQUIDEZ: Es la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de corto plazo, siendo la capacidad que tiene una empresa para obtener dinero en efectivo.</b>		
<b>Indicadores Financieros</b>	<b>2015</b>	<b>Explica</b>
Liquidez Corriente	27%	Por cada bolívar que debe CORPOELEC, solo está en condiciones de pagar Bs. 0,28 con base a sus ingresos.
Capital de Trabajo	Bs. - 186.833.014.742	CORPOELEC cuenta con un déficit de Bs. -186.833.014.742 para atender las operaciones en marcha de la empresa.
Prueba Acida	Bs. 0,2412	Por cada bolívar que debe CORPOELEC, solo puede respaldar Bs. 0,28 con base en sus ingresos, esto sin contar sus inventarios.
<b>ACTIVIDAD: Establece el grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa, maneja los recursos y la recuperación de los mismos.</b>		
Número de días cartera en mano	457,81 Días	CORPOELEC tarda 457,81 días en promedio en facturar las deudas que tiene con sus clientes.
Rotación de Cartera	0,78 Veces x Año	Indica el número de veces que las cuentas por cobrar son convertidas en efectivo por la empresa en un año
Rotación del Activo Total	0,0950 Veces	Nos dice que por cada Bs. 100 que invirtió CORPOELEC la empresa generó Bs. 9,5
<b>ENDEUDAMIENTO: Son las razones financieras que nos permiten establecer el nivel de endeudamiento de la empresa o lo que es igual a establecer la participación de los acreedores sobre los activos de la empresa.</b>		
Nivel de Endeudamiento	148%	Por cada Bs.100 que la CORPOELEC posee, debe 148. En la memoria cuenta no se especifica con quien está endeudado CORPOELEC.
Apalancamiento	-3,056	Los accionistas de CORPOELEC (el Estado) tiene comprometido 3 veces el patrimonio en relación con las deudas.
<b>RENTABILIDAD: Son las razones financieras que nos permiten establecer el grado de rentabilidad para los accionistas y a su vez el retorno de la inversión a través de las utilidades generadas.</b>		
Margen Bruto	-236,17%	CORPOELEC por cada bolívar invertido en la prestación del servicio eléctrico perdió Bs 2,36
Gasto de Administración a Ventas	83,52%	CORPOELEC invierte en Gastos de Administración el 83,52% de sus ingresos generados por sus Ventas.

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta de MPPEE 2015

#### 4.2 Proyectos de Entes adscritos al MPPEE

Tabla 22 - Relación entre Presupuesto y Metas Ejecutadas por Entes Adscritos del MPPEE

Ente	Proyecto	PRESUPUESTO			METAS FISICAS		
		Ley	Modificaciones	% de Ejecución	Unidades	Meta	%
Fundelec	Estudio de factibilidad para el Desarrollo de la Industria Fotovoltaica en Venezuela	Sin información	2.261.899	15,98%	Sin información	Sin información	0%
	Desarrollo del Primer Prototipo Nacional de un Equipo Móvil No Tripulado (ROBOT) para el Monitoreo, Exploración y Reconocimiento de Líneas de Transmisión en Operación	8.132.474	10.607.630	54%	Prototipo	1	100%
	Interconexión de las unidades de servicio y mantenimiento a través de un sistema y red satelital	Sin información	8.048.491	25%	Sin información	Sin información	0%
	Estudio de Factibilidad para la Construcción de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas	24.438.457	37.432.102	1%			2%
	Mantenimiento de Sistemas de Energías Renovables Instalados en Comunidades Aisladas, Indígenas y Fronterizas de Venezuela	53.872.078	83.214.605	28%	Mantenimiento	1000	43%
	Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de las Trabajadoras y Trabajadores del Sector Eléctrico Nacional	26.992.394	39.056.082	70%	Persona	2400	100%
	Mesas de Energía		562.450.908	92%			65%
	Desarrollo de Herramienta para el Diseño Óptimo de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), Considerando los Sistemas de Generación y Transmisión en Forma Conjunta	9.012.736	12.709.620	23%	Herramienta tecnológica	1	55%
	Renovación tecnológica y estabilización del Sistema Uniforme para el Control y la Regulación de la Electricidad (Sucre)	13.723.245	17.285.334	42%	Modulo	4	48%
	Instalación de Sistemas de Energías Renovables	88.382.191	88.384.191	0,54%	Instalación	500	9%
	Acompañamiento técnico y metodológico a grandes usuarios en eficiencia energética	9.312.672	13.414.650	60%	Asistencia Técnica	50	116%

	Implantación y puesta en marcha de la aplicación especializada para la fiscalización del servicio eléctrico a nivel nacional	13.318.394	17.659.874	29%	Herramienta tecnológica	1	50%
	Estudio de Caracterización de las Cargas (ECC) a Nivel Nacional	9.199.008	11.946.567	26%	Herramienta tecnológica	Herramienta tecnológica	48%
	Instalación de sistemas Híbridos (Eólicos-Fotovoltaicos-Diesel) en comunidades aisladas, indígenas y fronterizas	23.143.083	48.314.659	10,96%			25%
<b>Fidelz</b>	Programa de modernización y desarrollo aplicado al Sistema Eléctrico Nacional	29.554.854	29.554.854	9,51%	Proyecto de Investigación	6	0,00%
	Modernización y Sistematización de los Centros de Información de Corpoelec	13.285.174	13.285.174	1,83%	Centro piloto	3	0,00%
<b>CVG Cabelum</b>	Producir y Comercializar Alambrón y Conductores de Aluminio	920.398.082	1.335.058.978	89,99%	Tonelada	24.000	87,69 %
	Desarrollo Social a las Comunidades Aledañas a la Empresa CVG CVG Cabelum	1.250.000	1.250.000	31,03%	Programa	15	38%
<b>Corpoelec Industrial</b>	Consolidación de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica	23.660.293	23.660.292	18,36%	Documento	26	30%

	Conceptualización de unidades productivas de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica	16.364.386	16.364.386	33,47%	Documento	20	35,00 %
	Ingeniería y Construcción de Unidades Productivas para el Sector Eléctrico.	3.549.324.039	4.276.618.017	13,70%	Documento	18	50,00 %
	Producción de Bienes y Servicios de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica.	1.100.175.538	1.100.175.539	5,75%	Plan	1	6,53%
	Plan de Comercialización y Suministro de la Corporación Industrial para la Energía Eléctrica.	1.862.848.514	1.862.848.514	14,96%	Requisición	50	46,16 %
<b>S.A. Arocoi</b>	Adecuación y Mantenimiento de la Infraestructura e Instalaciones del Centro Comercial Aracol	3.546.943	3.641.369	73,07%	Metro Cuadrado	3.033	100,00 %
<b>Serdeco C.A</b>	Gestión comercial a través de Serdeco de los servicios de aseo urbano	7.107.296	7.107.296	30,13%	Municipio Atendido	18	25,00 %
<b>EDC Network Comunicaciones</b>	Modernización y Ampliación de la Red de EDC Network Comunicaciones para la prestación de Servicios de Telecomunicaciones	565.486.571	565.486.571	44,00%	Nodo	48	17,20 %

Fuente: Cálculos propios basados en datos de la Memoria y Cuenta de MPPEE 2015

Los resultados observados demuestran importantes deficiencias en el cumplimiento de las metas fijadas por los entes adscritos del MPPEE. Así lo evidencia el caso del ente descentralizado sin fines empresariales Fundelec, en donde apenas 2 de los 14 proyectos aprobados superaron el 70% de los objetivos planteados y de los 12 proyectos restantes 9 no superaron el 50% de las metas fijadas para 2015 según la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.164.

En el caso del ente descentralizado sin fines empresariales Fidelz, reconocen el incumplimiento de las metas fijadas para 2015. A pesar de contar con solo dos proyectos, ninguno de los dos llegó ni al 10% de cumplimiento de la meta prevista.

La Memoria y Cuenta reconoce como obstáculos de Fidelz para la puesta en marcha de los proyectos la falta de firma en los convenios entre Fidelz y Corpoelec, lo que habría impedido ejecutar las actividades programadas, lo que evidencia las debilidades gerenciales del Ministerio en coordinar las actividades de sus entes adscritos.

De los 25 proyectos ejecutados por los entes adscritos al MPPEE (sin contar a Corpoelec) solo cuatro tuvieron un cumplimiento del 100% de las metas fijadas para 2015, mientras que 18 proyectos no alcanzaron el 50% de los objetivos, y de esos 18 hay 8 que no llegaron ni al 20% de las metas.

El Fondo para la Energía Eléctrica a pesar de ser creado como un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica, con autonomía funcional y capacidad de gestión financiera, administrativa, operativa, presupuestaria, según Gaceta Oficial N° 6.174 Extraordinario del 20 de febrero de 2015, no rindió cuentas en el informe de Memoria y Cuenta del MPPEE. No hay información del total de recursos que administro el Fondo y al revisar los ingresos que por Ley debería tener el fondo, se logra determinar que al menos contó en diciembre de 2015 con Bs. **194.432.000** proveniente del 0,1% de la facturación mensual por el servicio eléctrico como se muestra a continuación:

Fondo para la Energía Eléctrica		
Ingresos del Fondo previstos en Ley	Monto	Información en MyC
Ley de Presupuesto 2015	0	No hay
Aportes presupuestarios directos del Poder Público Nacional, Estatal y Municipal	Sin información	Sin información
Los montos provenientes de las multas impuestas según lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico	Sin información	Sin información
Los beneficios producto de excedentes, rentas e intereses que resulten de la administración de sus recursos.	Sin información	Sin información
Los bienes, derechos y acciones de cualquier naturaleza que le sean asignados o le transfiera el Ejecutivo Nacional o los que adquiera en la realización de sus actividades	Sin información	Sin información
Los recursos financieros y no financieros asignados por el Ejecutivo Nacional.	Sin información	Sin información
Los recursos derivados de convenios, tratados o instrumentos contractuales suscritos con entes u órganos públicos o privados, Nacionales, Municipales o	Sin información	Sin información

Internacionales.		
Las donaciones, legados, auxilios, contribuciones, subvenciones, transferencias o cualquier clase de asignación lícita de personas naturales y jurídicas.	Sin información	Sin información
Los bienes o ingresos que adquiera por cualquier título lícito.	Sin información	Sin información
La captación para el financiamiento de los programas.	Sin información	Sin información
El cero coma uno por ciento (0,1%) de la facturación mensual del operador y prestador del servicio eléctrico.	<b>Bs.194.432.000<sup>3</sup></b>	Sin información
Por el cobro de las tarifas generadas por la certificación y homologación de equipos eléctricos.	Sin información	Sin información
Cualquier otro recurso producto de su autogestión.	Sin información	Sin información

Fuente: Cálculos propios sacados de la Memoria y Cuenta del MPPEE 2015 y del Reglamento Orgánico del MPPEE

Esta información es de utilidad para contextualizar la gestión integral del Ministerio y sus entes adscritos, a la vez que contribuye a comprender los resultados obtenidos por las iniciativas acometidas en el 2015 con relación a los problemas energéticos presentados en el país en la actualidad.

Ante todas estas inconsistencias se recomienda a la Asamblea Nacional exigir la explicación del Ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez como responsable de las políticas y acciones que ejecuta o deja de ejecutar el Ministerio, y más aún si se tiene en cuenta la crisis en materia energética que afronta el país y que ha vendió derivándose en un constante racionamiento eléctrico.

(Apartado)

Según la página 301 de la Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la **Economía y Finanzas**, el BANDES destinó \$6.000.000 para “El sistema eléctrico de Cuba”

<sup>3</sup> Se refiere al 0,1% de los recursos ingresados a Corpoelec por la facturación del servicio eléctrico en 2015

## 6. Anexos

Instructivo mediante el cual se regula la formación de la Memoria y Cuenta anual de los órganos de la administración pública central según Gaceta Oficial N° 38600 y 38605

Transparencia Venezuela			
Ministerio de Energía Eléctrica	A	P	C
<b>PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA</b>			
<b>Denominación y competencias del órgano y marco normativo aplicable</b>			
Misión institucional		x	
Competencias		x	
Estructura organizativa		x	
Marco normativo		x	
Relación de los órganos desconcentrados	x		
Relación de los entes descentralizados	x		
Logros alcanzados			
Contribución a los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación		x	
Contribución con los demás objetivos estratégicos de la acción anual del gobierno	x		
Líneas de acción			
Políticas		x	
Estrategias		x	
Planes generales	x		
Objetivos		x	
Metas	x		
Proyectos ejecutados			
Nombre y descripción de los proyectos			x
Monto total de recursos asignados para cada proyecto		x	
Monto total de recursos asignados a cada proyecto para el período rendido		x	
Monto total de recursos ejecutados en cada proyecto durante el período rendido		x	
Fuente de Financiamiento aplicada a cada Proyecto	x		
Entidad Federal en la cual se desarrolla la ejecución física de cada proyecto		x	
Fecha de inicio del la ejecución de cada Proyecto y fecha de culminación			x
Objetivos específicos y metas de cada proyecto	x		



Resultados de cada proyecto (avance físico y financiero de los bienes o servicios, productos obtenidos, en términos absolutos y porcentuales)	x		
<b>Obstáculos de la gestión</b>			
Limitaciones técnicas, presupuestarias, financieras, políticas o de cualquier otra índole que hayan impedido o coartado el logro de los resultados obtenidos		x	
<b>Descripción de los órganos desconcentrados que lo integran e informes de gestión</b>			
Naturaleza de los órganos			x
<b>Recursos transferidos</b>	x		
Ingresos devengados		x	
<b>Régimen jurídico aplicable</b>		x	
Informes de gestión	x		
<b>Actividades de control ejercidas sobre los órganos</b>	x		
<b>Descripción de los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales</b>			
Naturaleza jurídica de los entes			x
<b>Recursos transferidos</b>		x	
<b>Ingresos devengados</b>		x	
<b>Régimen jurídico aplicable</b>		x	
<b>Informes de gestión</b>	x		
<b>Actividades de control ejercidas sobre los entes</b>	x		
<b>Líneas y planes de acción para el año siguiente</b>			
Políticas y demás orientaciones estratégicas que servirán de marco a la gestión institucional para el año siguiente		x	
	A	P	C
<b>PRESENTACIÓN DE LA CUENTA</b>			
<b>Exposición de Motivos</b>			
Contiene una fundamentación cualitativa y cuantitativa sobre los hechos económicos y financieros, que justifique y establezca su vinculación con la memoria, con el plan estratégico y sus resultados, de manera que constituya una exposición integral de la gestión institucional y de la política sectorial		x	
<b>CUENTA DE GASTOS</b>			
<b>Estados contables mensuales (reporte (SIGECOF) "Ejecución Trimestral por Organismo")</b>			

Contiene la ejecución mensual del presupuesto de gastos por fuentes de financiamiento y a nivel de partidas presupuestarias, con indicación de los montos asignados inicialmente por ley, las modificaciones y el presupuesto acordado		x	
Indica los momentos legales del gasto (compromiso, causado y pago)		x	
Contiene la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles y el avance porcentual del compromiso con respecto al presupuesto acordado	x		
Resultado de contabilidades (reporte (SIGECOF) “Fuente Consolidado a Nivel de Partidas” )			
Señala trimestralmente la ejecución consolidada del presupuesto de gastos por fuentes de financiamiento y a nivel de partidas presupuestarias, con indicación de los montos asignados inicialmente por ley, las modificaciones y el presupuesto acordado			X
Indica los momentos legales del gasto (compromiso, causado y pago)			X
Contiene la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles y el avance porcentual del compromiso con respecto al presupuesto acordado			X
Proyectos y Acciones Centralizadas			
Proyectos			
Reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos			
Contiene reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos, por fuentes de financiamiento, a nivel de partidas presupuestarias, indicando la asignación inicial de ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, y los momentos legales del compromiso, causado y pago; así como la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles		x	
En el marco de las políticas sectoriales y del Plan Operativo Anual Institucional, por cada proyecto			
Se describen los resultados de cada proyecto al cierre del ejercicio económico financiero	x		
Contiene el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados	x		
Contiene la explicación de los posible incumplimientos	x		
Acciones Centralizadas			

<b>Reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos</b>			
Contiene reporte sobre la ejecución financiera anual del presupuesto de gastos, por fuentes de financiamiento, a nivel de partidas presupuestarias, indicando la asignación inicial de ley, las modificaciones, el presupuesto acordado, y los momentos legales del compromiso, causado y pago; así como la información relativa a los créditos presupuestarios disponibles		x	
<b>En el marco de las políticas sectoriales y del Plan Operativo Anual Institucional, por cada Acción Centralizada</b>			
Se describen los resultados de cada acción centralizada al cierre del ejercicio económico financiero	x		
Contiene el correspondiente análisis de las metas y objetivos alcanzados	x		
Contiene la explicación de los posible incumplimientos	x		
<b>INFORMACIÓN SOBRE LOS ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE</b>			
<b>Órganos desconcentrados y Entes descentralizados funcionalmente</b>			
<b>Transferencia de recursos</b>			
Recursos transferidos, señalando las fechas, montos y conceptos de las transferencias	x		
<b>Estados financieros</b>			
Estado de la Situación Financiera (cuentas reales clasificadas en activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, contenidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales, dictado por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública)		x	
Estado de Rendimiento Financiero (cuentas nominales de ingresos y gastos contenidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales con indicación de resultado económico ahorro (ganancia) desahorro (pérdida) o equilibrio (igualdad), del ejercicio económico financiero)			
Estado de Movimientos de las Cuentas del Patrimonio (variaciones ocurridas en las cuentas que componen el patrimonio durante el ejercicio económico financiero, a partir del saldo del ejercicio anterior)		x	

Estado de Flujo de Efectivo (movimientos del efectivo o su equivalente ocurridos durante ejercicio económico financiero rendido, según se produzcan en las distintas actividades de operación, de inversión y de financiamiento que el ente realice)			x
Variaciones relativas y porcentuales de cada uno de los estados financieros, ocurridas durante el ejercicio económico financiero rendido con respecto al inmediato anterior.		x	
Notas explicativas por cada estado financiero, necesarias para detallar, ampliar o definir claramente el contenido de las cuentas	x		
<b>ANEXOS: Reportes de ejecución presupuestaria de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales</b>			
Presenta anexo los reportes de ejecución presupuestaria de los Entes Descentralizados Sin Fines Empresariales			x
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL GENERAL PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>38,39</b>		
<b>TOTAL GENERAL PORCENTUAL DE INCUMPLIMIENTO</b>	<b>61,61</b>		
